
Septième séance, sûrement la séance la plus vide

J'ai tout d'abord utilisé des chutes de bois afin de créer des fixations pour le couvercle, ainsi la partie plexiglass peut simplement reposer sur la partie boid du couvercle.

Nous obtenons donc un aspect final sympathique.

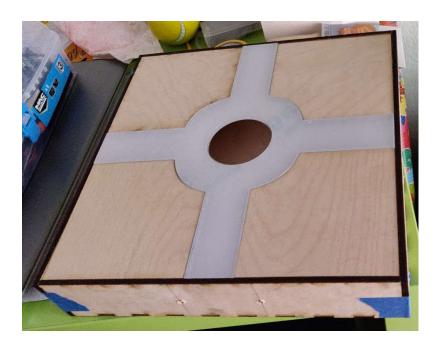

Le reste de cette séance a simplement été des soudures étant donné qu'il nous faut 4 bandes de LEDs pour le bloc central, 4 pour la fontaine, une pour chaque bloc annexe (il y a deux blocs annexes pour l'instant). J'ai eu le temps de finir les bandes de LEDs pour le bloc centrale et de faire la majorité de celle pour la fontaine.

(Les bandes de LEDs sont très difficiles à souder étrangement, l'étain n'adhère parfois pas même quand il y a la patte de cuivre.)
